

Инвестор

Заказчик (генподрядчик)

Подрядчик (субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

ООО "ТЭС-ЭНЕРГОАЛПАДКА"

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеньевый пер. - Бархатный пер." г.Артем

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеньевый пер. - Бархатный пер." г.Артем

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	20439353
по ОКТО	12231182
номер	ЕП-48/25/ДЭСК
дата	10.07.2025
Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеньевый пер. - Бархатный пер." г.Артем

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 890,17 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 165,75 тыс.руб.

Сметная трудоемкость: 417,25 чел.час

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
25123111	31.12.2025	с	по
		10.07.2025	31.12.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвлении е	6	1	6					
		Всего по позиции					1 009,74		6 056,46		
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	12	1	12					
		Всего по позиции					2 649,13		31 789,61		
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	12	1	12					
		Всего по позиции					366,55		4 398,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	12	1	12			
		Всего по позиции							2 478,92
									29 747,00
Раздел 2. Реконструкция									
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	35	1	35			
		Всего по позиции							1 940,59
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	11	1	11			
		Всего по позиции							627,37
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	12	1	12			
		Всего по позиции							743,22
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	11	1	11			
		Всего по позиции							8 867,75
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	12	1	12			
		Всего по позиции							17 917,90
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,7	1	0,7			
		Всего по позиции							250 600,67
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	6	1	6				
		Всего по позиции							2 796,74
12	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	39,55	1	39,55			
		Всего по позиции							328,15
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	39,55	1	39,55			
		Всего по позиции							12 978,33
									12 978,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.7б)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	39,55	1	39,55	328,15		12 978,33
		Всего по позиции							12 978,33
Раздел 3. Оборудование, материалы									
15	*	Жб опоры 12м	шт	22	1	22	12 333,71	1,02	276 768,45
		Всего по позиции							276 768,45
16	*	Жб опоры 10 м	шт	13	1	13	11 810,08	1,02	156 601,66
		Всего по позиции							156 601,66
17	*	Сопряжение СК	шт	12	1	12	2 077,22	1,02	25 425,17
		Всего по позиции							25 425,17
18	*	Гайка М16	шт	48	1	48	8,79	1,02	430,36
		Всего по позиции							430,36
19	*	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	530	1	530	550,00	1,02	297 330,00
		Всего по позиции							297 330,00
20	*	Провод СИП2 3х70+1х50	м	170	1	170	321,00	1,02	55 661,40
		Всего по позиции							55 661,40
21	*	Провод СИП4 4х25	м	100	1	100	108,76	1,02	11 093,52
		Всего по позиции							11 093,52
22	*	Провод СИП 4 2*16	м	40	1	40	58,00	1,02	2 366,40
		Всего по позиции							2 366,40
23	*	Зажим анкерный РА-2200	шт	8	1	8	499,11	1,02	4 072,74
		Всего по позиции							4 072,74
24	*	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	14	1	14	127,00	1,02	1 813,56
		Всего по позиции							1 813,56
25	*	Зажим поддерживающий PS 1500	шт	10	1	10	465,00	1,02	4 743,00
		Всего по позиции							4 743,00
26	*	Крюк универсальный SOT 29.10	шт	52	1	52	225,13	1,02	11 940,90
		Всего по позиции							11 940,90
27	*	Лента монтажная F20.07	м	104	1	104	45,53	1,02	4 829,82
		Всего по позиции							4 829,82
28	*	Скрепка B200 (бугель)	шт	104	1	104	17,49	1,02	1 855,34
		Всего по позиции							1 855,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29		Зажим ответвительный ОР 95 М	шт	60	1	60	145,23	1,02	8 888,08
*		Всего по позиции							8 888,08
30		Зажим анкерный РА-1500	шт	16	1	16	300,00	1,02	4 896,00
*		Всего по позиции							4 896,00
Итого по акту:									
Всего прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
Материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Монтажные работы									
в том числе:									
Материалы									
Всего									
Всего ФОТ (справочно)									
Всего накладные расходы (справочно)									
Всего сметная прибыль (справочно)									
НДС 20%									
ВСЕГО по акту									
справочно:									
Затраты труда рабочих									
Материалы заказчика									
Строительные работы									
Гайка М16, "шт" Кол-во: 48									
Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 13									
Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 22									
Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 14									
Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 60									
Зажим поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 10									
Крюк универсальный SOT 29 10, "шт" Кол-во: 52									
Лента монтажная F 20 07, "м" Кол-во: 104									
Провод СИП 2*3+120+1*95, "м" Кол-во: 530									
417,2503899									
430,36									
156 601,66									
276 768,45									
1 813,56									
8 888,08									
4 743,00									
11 940,90									
4 829,82									
297 330,00									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 40							2 366,40
		Скрепка В200 (бугель), "шт" Кол-во: 104							1 855,34
		Сопрежение СК, "шт" Кол-во: 12							25 425,17
		Всего							792 992,74
		Монтажные работы							
		Зажим анкерный РА-1500, "шт" Кол-во: 16							4 896,00
		Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 8							4 072,74
		Провод СИП2 3х70+1х50, "м" Кол-во: 170							55 661,40
		Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 100							11 093,52
		Всего							75 723,66
		Всего							868 716,40




Сл. Ликвидатор
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОАУТОМАТИКА"

Принял: Директор Юго-Западного сетевого округа
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"



 /Наумкин И.И./

 /О.И. Черничкин/

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"		по ОКТО	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	20439353
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАЙФ"		по ОКТО	12231182
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем (наименование, адрес)			
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
			номер	ЕП-48/25/ДЭСК
			дата	10.07.2025
			Вид операции	
Договор подряда (контракт)				
Вид деятельности по ОКДП				
номер				
дата				
Вид операции				

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г. Артем
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 945,27 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 79,47 тыс.руб.
Сметная трудоемкость: 197,98 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ТСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	3	1	3			
		Всего по позиции					1 009,74		3 029,23
2	ТСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	5	1	5			
		Всего по позиции					2 649,13		13 245,67
3	ТСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	5	1	5			
		Всего по позиции					366,55		1 832,75
4	ТСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	5	1	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
2 478,91									
12 394,56									
Раздел 2. Реконструкция									
5	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	13	1	13			
		Всего по позиции					1 940,60		25 227,75
6	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	13	1	13			
		Всего по позиции					627,38		8 165,90
7	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	13	1	13			
		Всего по позиции					8 867,75		115 280,79
8	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,504	1	0,504			
		Всего по позиции					250 600,71		126 302,76
9	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	3	1	3			
		Всего по позиции					2 796,74		8 390,22
10	П 03-01-01-045 (С6,Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	14,69	1	14,69	505,06		7 419,33
		Всего по позиции					7 419,33		
11	П 01-01-01-003 (С6,Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	14,69	1	14,69	328,15		4 820,52
		Всего по позиции					4 820,52		
12	Р 01-01-02-003 (С6,Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	14,69	1	14,69	328,15		4 820,52
		Всего по позиции					4 820,52		
Раздел 3. Оборудование, материалы									
13		Ж/б опоры 12м	шт	9	1	9	12 333,71	1,02	113 223,46
		Всего по позиции					113 223,46		
14		Ж/б опоры 10 м	шт	4	1	4	11 810,08	1,02	48 185,13
		Всего по позиции					48 185,13		
15		Провод СИП 2*3+120+1*95	м	420	1	420	550,00	1,02	235 620,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							235 620,00
16	*	Провод СИП 2 3*70+1*50	м	84	1	84		1,02	27 503,28
		Всего по позиции							27 503,28
17	*	Провод СИП4 4х25	м	100	1	100		1,02	11 093,52
		Всего по позиции							11 093,52
18	*	Провод СИП 4 2*16	м	40	1	40		1,02	2 366,40
		Всего по позиции							2 366,40
19	*	Зажим анкерный РА-2200	шт	9	1	9		1,02	4 581,83
		Всего по позиции							4 581,83
20	*	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	10	1	10		1,02	1 295,40
		Всего по позиции							1 295,40
21	*	Зажим поддерживающий PS 1500	шт	11	1	11		1,02	5 217,30
		Всего по позиции							5 217,30
22	*	Крюк универсальный SOT 29,10	шт	5	1	5		1,02	1 148,16
		Всего по позиции							1 148,16
23	*	Лента монтажная F20.07	м	10	1	10		1,02	464,41
		Всего по позиции							464,41
24	*	Скрепка B200 (бугель)	шт	10	1	10		1,02	178,40
		Всего по позиции							178,40
25	*	Зажим ответительный ОР 95 м	шт	40	1	40		1,02	5 925,38
		Всего по позиции							5 925,38
Итого по акту:									
Всего прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Монтажные работы									
в том числе:									
материалы									
15 675,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего							787 722,67
		Всего ФОТ (справочно)							79 468,40
		Всего накладные расходы (справочно)							81 852,44
		Всего сметная прибыль (справочно)							40 528,89
		НДС 20%							157 544,53
		ВСЕГО по акту							945 267,20
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				197,975894			
		Материалы заказчика							
		Строительные работы							
		Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 4							48 185,13
		Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 9							113 223,46
		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 10							1 295,40
		Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 40							5 925,38
		Зажим поддерживающий РС 1500, "шт" Кол-во: 11							5 217,30
		Крюк универсальный SOT 29, 10, "шт" Кол-во: 5							1 148,16
		Лента монтажная F20 07, "м" Кол-во: 10							464,41
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 420							235 620,00
		Провод СИП 2 3*70+1*50, "м" Кол-во: 84							27 503,28
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 40							2 366,40
		Скрепка В200 (букель), "шт" Кол-во: 10							178,40
		Всего							441 127,32
		Монтажные работы							
		Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 9							4 581,83
		Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 100							11 093,52
		Всего							15 675,35
		Всего							456 802,67
		Возврат материалов							
		Строительные работы							
		Лента монтажная F20 07, "м" Кол-во: 48							
		Скрепка В200 (букель), "шт" Кол-во: 12							
		Всего							



[Signature]

/Наумкин И.И./

[Signature]

/Ю.И. Чернышкин/

Инвестор			Форма по ОКУД	Код	
Заказчик (Генподрядчик)	Организация, адрес, телефон, факс	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"	по ОКТО	0322005	
Подрядчик (Субподрядчик)	Организация, адрес, телефон, факс	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОПАДАК"	по ОКТО	20438353	
Строжка	Организация, адрес, телефон, факс	Реконструкция ВЛ 0,4(0,23)кВ в ВЛ 0,4кВ КТП - 205 ф. "Луцевая-пер. Факельный" г. Артем	по ОКТО	12231182	
Объект	Наименование, адрес	Реконструкция ВЛ 0,4(0,23)кВ в ВЛ 0,4кВ КТП - 205 ф. "Луцевая-пер. Факельный" г. Артем	Вид деятельности по ОКДП		
			Договор подряда (контракт)		
			номер	ЕП-48/25/ДЭСК	
			дата	10.07.2025	
			Вид операции		
			Номер документа	Дата составления	Отчетный период
			25123111	31.12.2025	с по
					10.07.2025 31.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ 0,4(0,23)кВ в ВЛ 0,4кВ КТП - 205 ф. "Луцевая-пер. Факельный" г. Артем
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 005,09 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 180,85 тыс. руб.
Сметная трудоемкость: 451,85 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	10	1	10			
		Всего по позиции					1 009,74		10 097,44
2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	22	1	22			
		Всего по позиции					2 649,13		58 280,96
3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	22	1	22			
		Всего по позиции					366,55		8 064,01
4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	22	1	22			
		Всего по позиции					2 478,92		54 536,18
Раздел 2. Реконструкция									
5	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	26	1	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: Материалов оснастки одностоечных опор	шт	4	1	4	1 940,59		50 455,46
		Всего по позиции					627,37		2 509,49
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: Материалов оснастки сложных опор	шт	11	1	11			
		Всего по позиции					743,22		8 175,39
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	4	1	4			
		Всего по позиции					8 867,75		35 471,01
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	11	1	11			
		Всего по позиции					17 917,90		197 096,94
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	1,055	1	1,055			
		Всего по позиции					250 600,68		264 383,72
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	10	1	10			
		Всего по позиции					2 796,74		27 967,37
12	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	29,38	1	29,38	505,06		14 838,66
		Всего по позиции					328,15		9 641,05
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	29,38	1	29,38			
		Всего по позиции					328,15		9 641,05
14	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	29,38	1	29,38			
		Всего по позиции					12 333,71		213 866,53
15		Ж/б опоры 12м	шт	17	1	17			
		Всего по позиции					11 810,08		108 416,53
16		Ж/б опоры 10 м	шт	9	1	9			
		Всего по позиции					2 077,22		23 306,41
17		Сопряжение СК	шт	11	1	11			
		Всего по позиции					1,02		23 306,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Гайка М16	шт	44	1	44	8,79	1,02	394,50
*		Всего по позиции							394,50
19		Провод СИП 2 3*120+1*95	м	840	1	840	550,00	1,02	471 240,00
*		Всего по позиции							471 240,00
20		Провод СИП2 3х70+1х50	м	75	1	75	321,00	1,02	24 556,50
*		Всего по позиции							24 556,50
21		Провод СИП4 4х25	м	140	1	140	108,76	1,02	15 530,93
*		Всего по позиции							15 530,93
22		Провод СИП 4 2*16	м	60	1	60	58,00	1,02	3 549,60
*		Всего по позиции							3 549,60
23		Зажим анкерный РА-2200	шт	23	1	23	499,11	1,02	11 709,12
*		Всего по позиции							11 709,12
24		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	20	1	20	127,00	1,02	2 590,80
*		Всего по позиции							2 590,80
25		Зажим поддерживающий PS 1500	шт	18	1	18	465,00	1,02	8 537,40
*		Всего по позиции							8 537,40
26		Крюк универсальный SOT 29,10	шт	60	1	60	225,13	1,02	13 777,96
*		Всего по позиции							13 777,96
27		Лента монтажная F20,07	м	120	1	120	45,53	1,02	5 572,87
*		Всего по позиции							5 572,87
28		Скрепка В200 (бугель)	шт	120	1	120	17,49	1,02	2 140,78
*		Всего по позиции							2 140,78
29		Зажим ответвительный ОР 95 М	шт	90	1	90	145,23	1,02	13 332,11
*		Всего по позиции							13 332,11
30		Зажим анкерный РА1500	шт	4	1	4	300,00	1,02	1 224,00
*		Всего по позиции							1 224,00

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

1 392 393,16

180 851,69

230 506,18

981 035,29

1 617 884,22

180 851,69


230 506,18

928 014,74

186 277,24

92 234,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Монтажные работы							53 020,55
		в том числе:							
		материалы							53 020,55
		Всего							1 670 904,77
		Всего ФОТ (справочно)							180 851,69
		Всего накладные расходы (справочно)							186 277,24
		Всего сметная прибыль (справочно)							92 234,37
		НДС 20%							334 180,95
		ВСЕГО по акту							2 005 085,72
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				451,8498148			
		Материалы заказчика							
		Строительные работы							
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 44							394,50
		Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 9							108 416,53
		Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 17							213 866,53
		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 20							2 590,80
		Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 90							13 332,11
		Зажим поддерживающий РS 1500, "шт" Кол-во: 18							8 537,40
		Крюк универсальный SOT 29 10, "шт" Кол-во: 60							13 777,96
		Лента монтажная F20 07, "м" Кол-во: 120							5 572,87
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 840							471 240,00
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 60							3 549,60
		Скрепка В200 (бурель), "шт" Кол-во: 120							2 140,78
		Сопрежение СК, "шт" Кол-во: 11							23 306,41
		Всего							866 725,49
		Монтажные работы							
		Зажим анкерный РА1500, "шт" Кол-во: 4							1 224,00
		Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 23							11 709,12
		Провод СИП2 3*120+1*50, "м" Кол-во: 75							24 556,50
		Провод СИП4 4*25, "м" Кол-во: 140							15 530,93
		Всего							53 020,55
		ИТОГО							919 746,04

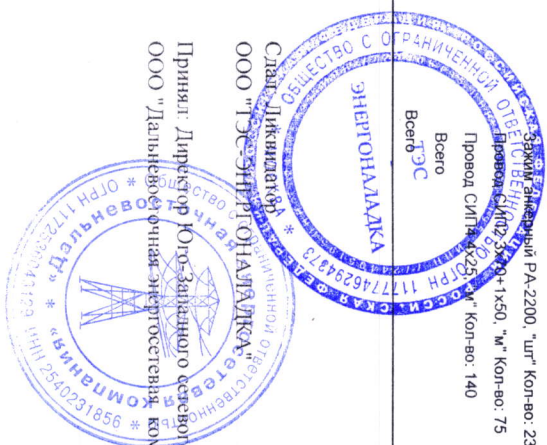

Служ. Лицензия №

ООО "ДСЭН ЭНЕРГОМАЛКА"

Принят Директор Юго-Западного сетевого округа
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

[Handwritten signature]

/О.И. Черныгин/

[Handwritten signature]

/О.И. Черныгин/

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" (организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ЭС-ЭНЕРГОАДИКА" (организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясенецкий пер." г.Артем (наименование, адрес)	
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясенецкий пер." г.Артем (наименование)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
Вид операции		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясенецкий пер." г.Артем

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1 553,96 тыс.руб.
135,43 тыс.руб.
339,41 чел.час.

Форма по ОККУД		Код	
		0322005	
по ОКТО			
по ОКТО		20439353	
по ОКТО		12231182	
стельности по ОКДП			
номер	ЕП_48/25/ДЭСК		
дата	10.07.2025		
Вид операции			
Номер документа		Дата составления	
25123111		31.12.2025	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ГЭСН3-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвлени е	7	1	7				
		Всего по позиции					1 009,74		7 068,21	
2	ГЭСН3-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	15	1	15				
		Всего по позиции					2 649,13		39 737,02	
3	ГЭСН3-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	15	1	15				
		Всего по позиции					366,55		5 498,20	
4	ГЭСН3-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	15	1	15				
		Всего по позиции					2 478,92		37 183,75	
Раздел 2. Реконструкция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	23	1	23			
		Всего по позиции					1 940,60		44 633,69
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	15	1	15			
		Всего по позиции					627,38		9 410,66
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	4	1	4			
		Всего по позиции					743,22		2 972,88
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	15	1	15			
		Всего по позиции					8 867,75		133 016,31
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	4	1	4			
		Всего по позиции					17 917,90		71 671,61
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,763	1	0,763			
		Всего по позиции					250 600,67		191 208,31
11	П 03-01-01-045 (С6.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	25,99	1	25,99			13 126,51
		Всего по позиции					328,15		8 528,62
12	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	25,99	1	25,99			
		Всего по позиции					328,15		8 528,62
13	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	25,99	1	25,99			
		Всего по позиции					12 333,71		213 866,53
14	*	Ж/б опоры 12м	шт	17	1	17			
		Всего по позиции					11 810,08		72 277,69
15	*	Ж/б опоры 10 м	шт	6	1	6			
		Всего по позиции					2 077,22		8 475,06
16	*	Соприжение СК	шт	4	1	4			
		Всего по позиции					1,02		8 475,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17		Гайка М16	шт	16	1	16	8,79	1,02	143,45
*		Всего по позиции							143,45
18		Провод СИП 2 3*120+1*95	м	660	1	660	550,00	1,02	370 260,00
*		Всего по позиции							370 260,00
19		Провод СИП2 3х70+1х50	м	43	1	43	321,00	1,02	14 079,06
*		Всего по позиции							14 079,06
20		Провод СИП4 4х25	м	60	1	60	108,76	1,02	6 556,11
*		Всего по позиции							6 556,11
21		Провод СИП 4 2*16	м	60	1	60	58,00	1,02	3 549,50
*		Всего по позиции							3 549,50
22		Зажим анкерный РА-2200	шт	9	1	9	499,11	1,02	4 581,83
*		Всего по позиции							4 581,83
23		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	12	1	12	127,00	1,02	1 554,48
*		Всего по позиции							1 554,48
24		Зажим поддерживающий РС 1500	шт	14	1	14	465,00	1,02	6 640,20
*		Всего по позиции							6 640,20
25		Крюк универсальный SOT 29,10	шт	36	1	36	225,13	1,02	8 266,77
*		Всего по позиции							8 266,77
26		Лента монтажная F20,07	м	72	1	72	45,53	1,02	3 343,72
*		Всего по позиции							3 343,72
27		Скрепка В200 (бугель)	шт	72	1	72	17,49	1,02	1 284,47
*		Всего по позиции							1 284,47
28		Зажим ответственный ОР 95 М	шт	50	1	50	145,23	1,02	7 406,73
*		Всего по позиции							7 406,73

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

Материалы

накладные расходы

Сметная прибыль

Монтажные работы

1 086 414,49
135 425,70
176 339,62
774 649,17
1 269 653,08
135 425,70
176 339,62
749 332,17
139 488,48
69 067,12
25 317,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		Материалы							
		Всего							25 317,00
		Всего ФОТ (справочно)							1 294 970,09
		Всего накладные расходы (справочно)							135 425,70
		Всего сметная прибыль (справочно)							139 488,48
		НДС 20%							69 067,12
		ВСЕГО по акту							258 994,02
		справочно:							1 553 964,11
		Затраты труда рабочих							339,4146545
		Материалы заказчика							
		Строительные работы							
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 16							143,45
		Жб опоры 10 м, "шт" Кол-во: 6							72 277,69
		Жб опоры 12м, "шт" Кол-во: 17							213 866,53
		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 12							1 554,48
		Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 50							7 406,73
		Зажим поддерживающий РС 1500, "шт" Кол-во: 14							6 640,20
		Крюк универсальный SOT 29 10, "шт" Кол-во: 36							8 266,77
		Лента монтажная F20 07, "м" Кол-во: 72							3 343,72
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 660							370 260,00
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 80							3 549,60
		Скрепка В200 (бугель), "шт" Кол-во: 72							1 284,47
		Соприжение СК, "шт" Кол-во: 4							8 475,06
		Всего							697 068,70
		Монтажные работы							
		Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 9							4 581,83
		Провод СИП2 3х70+1х50, "м" Кол-во: 43							14 079,06
		Провод СИП4 25, "м" Кол-во: 60							6 656,11
		Всего							25 317,00
		Всего							722 385,70



Сл. инвентаризатор
 ООО "ТЭС-ЭНЕРГОСЕРВИС"
 Принят: Директор Юго-Западного сетевого округа
 ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"


 /Наумкин И.И./

 /О.И. Черныihin/

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ЭС-ЭНЕРГОПАЛКА" (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	20439353
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября, 7-21" г. Артем (наименование, адрес)		по ОКТО	12231182
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября, 7-21" г. Артем (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)		номер	ЕП-48/25/ДЭСК
			дата	10.07.2025
			Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября, 7-21" г. Артем

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1 679,48 тыс.руб.

Средства на оплату труда

157,46 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

394,92 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25123111	31.12.2025	10.07.2025	31.12.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСН3-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	10	1	10			
		Всего по позиции					1 009,74		10 097,44
2	ГЭСН3-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	13	1	13			
		Всего по позиции					2 649,13		34 438,75
3	ГЭСН3-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	13	1	13			
		Всего по позиции					366,55		4 765,09
4	ГЭСН3-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	13	1	13			
		Всего по позиции					2 478,92		32 225,92
Раздел 2. Реконструкция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	29	1	29			
		Всего по позиции					1 552,48		45 021,79
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	21	1	21			
		Всего по позиции					501,90		10 539,90
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	4	1	4			
		Всего по позиции					594,57		2 378,29
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	21	1	21			
		Всего по позиции					8 867,75		186 222,83
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	4	1	4			
		Всего по позиции					17 917,90		71 671,61
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,748	1	0,748			
		Всего по позиции					250 600,67		187 449,30
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	е	10	1	10			
		Всего по позиции					2 796,74		27 967,37
12	П 03-01-01-045 (С6.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	32,77	1	32,77	505,06		16 550,82
		Всего по позиции					328,15		10 753,48
13	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	32,77	1	32,77			
		Всего по позиции					10 753,48		10 753,48
14	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	32,77	1	32,77			
		Всего по позиции					12 333,71	1,02	264 188,07
15	*	Ж/б опоры 12м	шт	21	1	21			
		Всего по позиции					11 810,08	1,02	96 370,25
16	*	Ж/б опоры 10 м	шт	8	1	8			
		Всего по позиции					96 370,25		96 370,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17		Сопровождение СК	шт	4	1	4	2 077,22	1,02	8 475,06
*		Всего по позиции							8 475,06
18		Гайка М16	шт	16	1	16	8,79	1,02	143,45
*		Всего по позиции							143,45
19		Провод СИП 2*3*120+1*95	м	496	1	496	550,00	1,02	278 256,00
*		Всего по позиции							278 256,00
20		Провод СИП 2*3*70+1*50	м	92	1	92	321,00	1,02	30 122,64
*		Всего по позиции							30 122,64
21		Провод СИП4 4х25	м	160	1	160	108,76	1,02	17 749,63
*		Всего по позиции							17 749,63
22		Провод СИП 4 2*16	м	40	1	40	58,00	1,02	2 366,40
*		Всего по позиции							2 366,40
23		Зажим анкерный РА-2200	шт	32	1	32	499,11	1,02	16 290,95
*		Всего по позиции							16 290,95
24		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	20	1	20	127,00	1,02	2 590,80
*		Всего по позиции							2 590,80
25		Зажим поддерживающий PS 1500	шт	12	1	12	465,00	1,02	5 591,60
*		Всего по позиции							5 591,60
26		Крюк универсальный SOT 29.10	шт	45	1	45	225,13	1,02	10 333,47
*		Всего по позиции							10 333,47
27		Лента монтажная F20.07	м	90	1	90	45,53	1,02	4 179,65
*		Всего по позиции							4 179,65
28		Скрепка B200 (бугель)	шт	90	1	90	17,49	1,02	1 605,58
*		Всего по позиции							1 605,58
29		Зажим ответственный ОР 95 М	шт	70	1	70	145,23	1,02	10 369,42
*		Всего по позиции							10 369,42

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы

в том числе:

Оплата труда

Эксплуатация машин и механизмов

Материалы

Накладные расходы

1 157 087,47

157 455,57

188 792,36

810 839,54

1 365 528,46

157 455,57

188 792,36



776 798,96

162 179,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сметная прибыль							80 302,33
		Монтажные работы							34 040,58
		в том числе:							
		материалы							34 040,58
		Всего							1 399 569,04
		Всего ФОТ (справочно)							157 455,57
		Всего накладные расходы (справочно)							162 179,24
		Всего сметная прибыль (справочно)							80 302,33
		НДС 20%							279 913,81
		ВСЕГО по акту							1 679 482,85
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				394 9159485			
		Материалы заказчика							
		Строительные работы							
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 16							143,45
		Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 8							96 370,25
		Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 21							264 188,07
		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 20							2 590,80
		Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 70							10 369,42
		Зажим поддерживающий РС 1500, "шт" Кол-во: 12							5 691,60
		Крюк универсальный SOT 29.10, "шт" Кол-во: 45							10 333,47
		Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 90							4 179,65
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 496							278 256,00
		Провод СИП 2 3*70+1*50, "м" Кол-во: 92							30 122,64
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 40							2 366,40
		Скрепка В200 (бурель), "шт" Кол-во: 90							1 605,58
		Соприжение СК, "шт" Кол-во: 4							8 475,06
		Всего							714 692,39
		Монтажные работы							
		Засова анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 32							16 290,95
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 160							17 749,63
		Всего							34 040,58
		Всего							748 732,97



Принят: Директор Юго-Западного сетевого округа
 ООО "Дальневосточная энергетическая компания"


 /Наумкин И.И./

 /Ю.И. Черныхий/

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

ООО "ТЭС-ЭНЕРГОПАДКА"

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

форма по ОКД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

номер

дата

Вид операции

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

ЕП-48/25/ДЭСК

10.07.2025

31.12.2025

10.07.2025

31.12.2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

Смета № Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

753,52 тыс.руб.

76,90 тыс.руб.

195,03 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	шт	9	1	9			
		Всего по позиции					1 009,74		9 087,70
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	17	1	17			
		Всего по позиции					2 649,13		45 035,27
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	17	1	17			
		Всего по позиции					366,54		6 231,26
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	15	1	15			
		Всего по позиции					2 478,92		37 183,75
5	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт	2	1	2			
		Всего по позиции					6 953,74		13 907,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Реконструкция									
6	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	10	1	10			
Всего по позиции							1 940,60		19 405,95
7	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	4	1	4			
Всего по позиции							627,37		2 509,49
8	ГЭСНЗ-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	3	1	3			
Всего по позиции							743,22		2 229,65
9	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	4	1	4			
Всего по позиции							8 867,75		35 471,01
10	ГЭСНЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	3	1	3			
Всего по позиции							17 917,90		53 783,70
11	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,175	1	0,175			
Всего по позиции							250 600,74		43 855,13
12	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,12	1	0,12			
Всего по позиции							184 944,33		22 193,32
13	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	шт	5	1	5			
Всего по позиции							2 796,74		13 983,72
14	П 03-01-01-045 (С6.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	11,3	1	11,3			
Всего по позиции							328,15		3 708,10
15	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	11,3	1	11,3			
Всего по позиции							328,15		3 708,10
16	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	11,3	1	11,3			
Всего по позиции							328,15		3 708,10
Всего по позиции							3 708,10		3 708,10

Раздел 3. Оборудование, материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17		Ж/Б опоры 12м	шт	7	1	7	12 333,71	1,02	88 062,69
*		Всего по позиции							88 062,69
18		Ж/Б опоры 10 м	шт	3	1	3	11 810,08	1,02	36 138,84
*		Всего по позиции							36 138,84
19		Сопряжение СК	шт	12	1	12	2 077,22	1,02	25 425,17
*		Всего по позиции							25 425,17
20		Гайка М16	шт	48	1	48	8,79	1,02	430,36
*		Всего по позиции							430,36
21		Провод СИП 2 3*120+1*95	м	175	1	175	550,00	1,02	98 175,00
*		Всего по позиции							98 175,00
22		Провод СИП 4х25	м	120	1	120	108,76	1,02	13 312,22
*		Всего по позиции							13 312,22
23		Провод СИП 4 2*16	м	60	1	60	58,00	1,02	3 549,60
*		Всего по позиции							3 549,60
24		Зажим анкерный РА-2200	шт	20	1	20	499,11	1,02	10 181,84
*		Всего по позиции							10 181,84
25		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	18	1	18	127,00	1,02	2 331,72
*		Всего по позиции							2 331,72
26		Зажим поддерживающий PS 1500	шт	10	1	10	465,00	1,02	4 743,00
*		Всего по позиции							4 743,00
27		Крюк универсальный SOT 29.10	шт	44	1	44	225,13	1,02	10 103,83
*		Всего по позиции							10 103,83
28		Лента монтажная F20.07	м	88	1	88	45,53	1,02	4 086,77
*		Всего по позиции							4 086,77
29		Скрепка В200 (бугель)	шт	88	1	88	17,49	1,02	1 569,90
*		Всего по позиции							1 569,90
30		Зажим ответвительный ОР 95 М	шт	80	1	80	145,23	1,02	11 850,77
*		Всего по позиции							11 850,77

Итого по акту:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы


в том числе:

Оплата труда

Эксплуатация машин и механизмов

76 904,57
100 925,60
331 689,29
604 438,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							308 175,23
		накладные расходы							79 211,71
		сметная прибыль							39 221,34
		Монтажные работы							23 494,06
		в том числе:							
		Материалы							23 494,06
		Всего							627 932,51
		Всего ФОТ (справочно)							76 904,57
		Всего накладные расходы (справочно)							79 211,71
		Всего сметная прибыль (справочно)							39 221,34
		НДС 20%							125 586,50
		ВСЕГО по акту							753 519,01
		справочно:							
		Затраты труда рабочих				195,0305562			
		Материалы заказчика							
		Строительные работы							
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 48							430,36
		Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 3							36 138,84
		Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 7							88 062,69
		Заким анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 18							2 331,72
		Заким ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 80							11 850,77
		Заким поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 10							4 743,00
		Крюк универсальный SOT 29.10, "шт" Кол-во: 44							10 103,83
		Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 88							4 086,77
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 175							98 175,00
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 60							3 549,60
		Скрепка В200 (бугель), "шт" Кол-во: 88							1 569,90
		Сопражение СК, "шт" Кол-во: 12							25 425,17
		Всего							286 467,65
		Монтажные работы							
		Заким анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 20							10 181,84
		Провод СИП4 4x25, "м" Кол-во: 120							13 312,22
		Всего							23 494,06
		Всего							309 961,71



Принят. Директор ООО "Дальневосточная энергетическая компания"

[Signature]

/Наумкин И.И./

[Signature]

/О.И. Чернышкин/

Инвестор: _____
Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАДКА"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205

Код
0322001
20439353
12231182
ЕП-48/25/ДЭСК
10.07.2025

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) _____
номер _____
дата _____
Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
25123111	31.12.2025	с 10.07.2025 по 31.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеньевый пер. - Бархатный пер." г.Артем	1	1 575 143,38	1 575 143,38	1 575 143,38
2	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем	1	787 722,67	787 722,67	787 722,67
3	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеньевый пер." г.Артем	1	1 294 970,09	1 294 970,09	1 294 970,09
4	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем	1	1 670 904,77	1 670 904,77	1 670 904,77
5	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артем	1	1 399 569,04	1 399 569,04	1 399 569,04
6	Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем	1	627 932,51	627 932,51	627 932,51
			Итого	7 356 242,46	
			Сумма НДС	1 471 248,49	
			Всего с учетом НДС	8 827 490,95	

Заказчик: Директор Юго-западного сетевого округа

должность

подпись

/О.И. Черничкин/
расшифровка подписи

М.П.

Подрядчик: Ликвидатор

должность

подпись

/И.И. Наумкин /
расшифровка подписи

М.П.
